

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成 29 年 6 月 20 日

計画の名称	1 川西市域における流域一体となった総合的な汚水・浸水対策の推進								
計画の期間	平成23年度 ~ 平成27年度 (5年間)	交付対象	川西市						
計画の目標	下水道未普及地域の解消及び浸水対策による水害に強いまちづくりにより、市民の快適で安心安全な生活の確保を図る。								
計画の成果目標(定量的指標)	・下水道未普及人口の低減								
定量的指標の定義及び算定式	末供用開始区域人口を平成22年度末の997人から最終目標年度には698人まで減少させる。			定量的指標の現況値及び目標値	備考				
	当初現況値 (H22当初)	中間目標値 (H25末)	最終目標値 (H27末)						
	997 人	840 人	698 人						
全体事業費	合計 (A + B + C)	594百万円	A	579百万円	B	C	15百万円	効果促進事業費の割合 C / (A + B + C)	2.6%

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	事後評価の実施時期
事後評価の実施体制	平成29年6月
川西市上下水道局の下水道事業担当部署により、事業実施状況・指標の達成状況の確認および評価を実施。	公表の方法
	事後評価後、川西市上下水道局ホームページにて公表する。

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																	
A1 下水道事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	事業及び 施設種別	省略 工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
											H23	H24	H25	H26	H27		
1-A	下水道	一般	川西市	直接	-	汚水	新設	未普及解消下水道事業(管渠)	整備面積 = 62.4ha	川西市						579	
											小計(下水道事業)					579	
											合計					579	
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
										H23	H24	H25	H26	H27			
											合計						
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考	

C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種		要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
						H23	H24				H25	H26	H27				
1-C	下水道	一般	川西市	直接	-	汚水	新設	枝線整備事業	整備面積 = 0.9ha	川西市						15	
											合計						
番号	一体的に実施することにより期待される効果																
1-C	基幹事業である幹線と接続した枝線整備を一体的に行うことにより、迅速に下水道未普及状況を解消し市民の快適で安心安全な生活を実現する。																

交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		・汚水管渠を整備することにより定量指標で掲げている未供用開始区域人口が減少し、良好な生活環境の促進が図られる。															
定量的指標の達成状況	指標（未供用 開始区域人口）	最終目標値	698 人	目標値と実績値 に差が出た要因	私道問題が解決出来ず、着工を見合わせた箇所があったため。												
		最終実績値	745 人														
	最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因														
		最終実績値															
	最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因														
		最終実績値															
	最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因														
		最終実績値															
最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因															
	最終実績値																
定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)																	


3. 特記事項（今後の方針等）









- ・平成23年度から平成27年度までの5年間で、社会資本整備総合計画による下水道事業を行い、定量的指標の目標値には届かなかったものの、着実に未普及地区の人口は減少させることができたものと考えられる。今後においても汚水整備を促進し、快適な生活環境の改善に取り組んでいく。

〔参考図面〕(汚水)

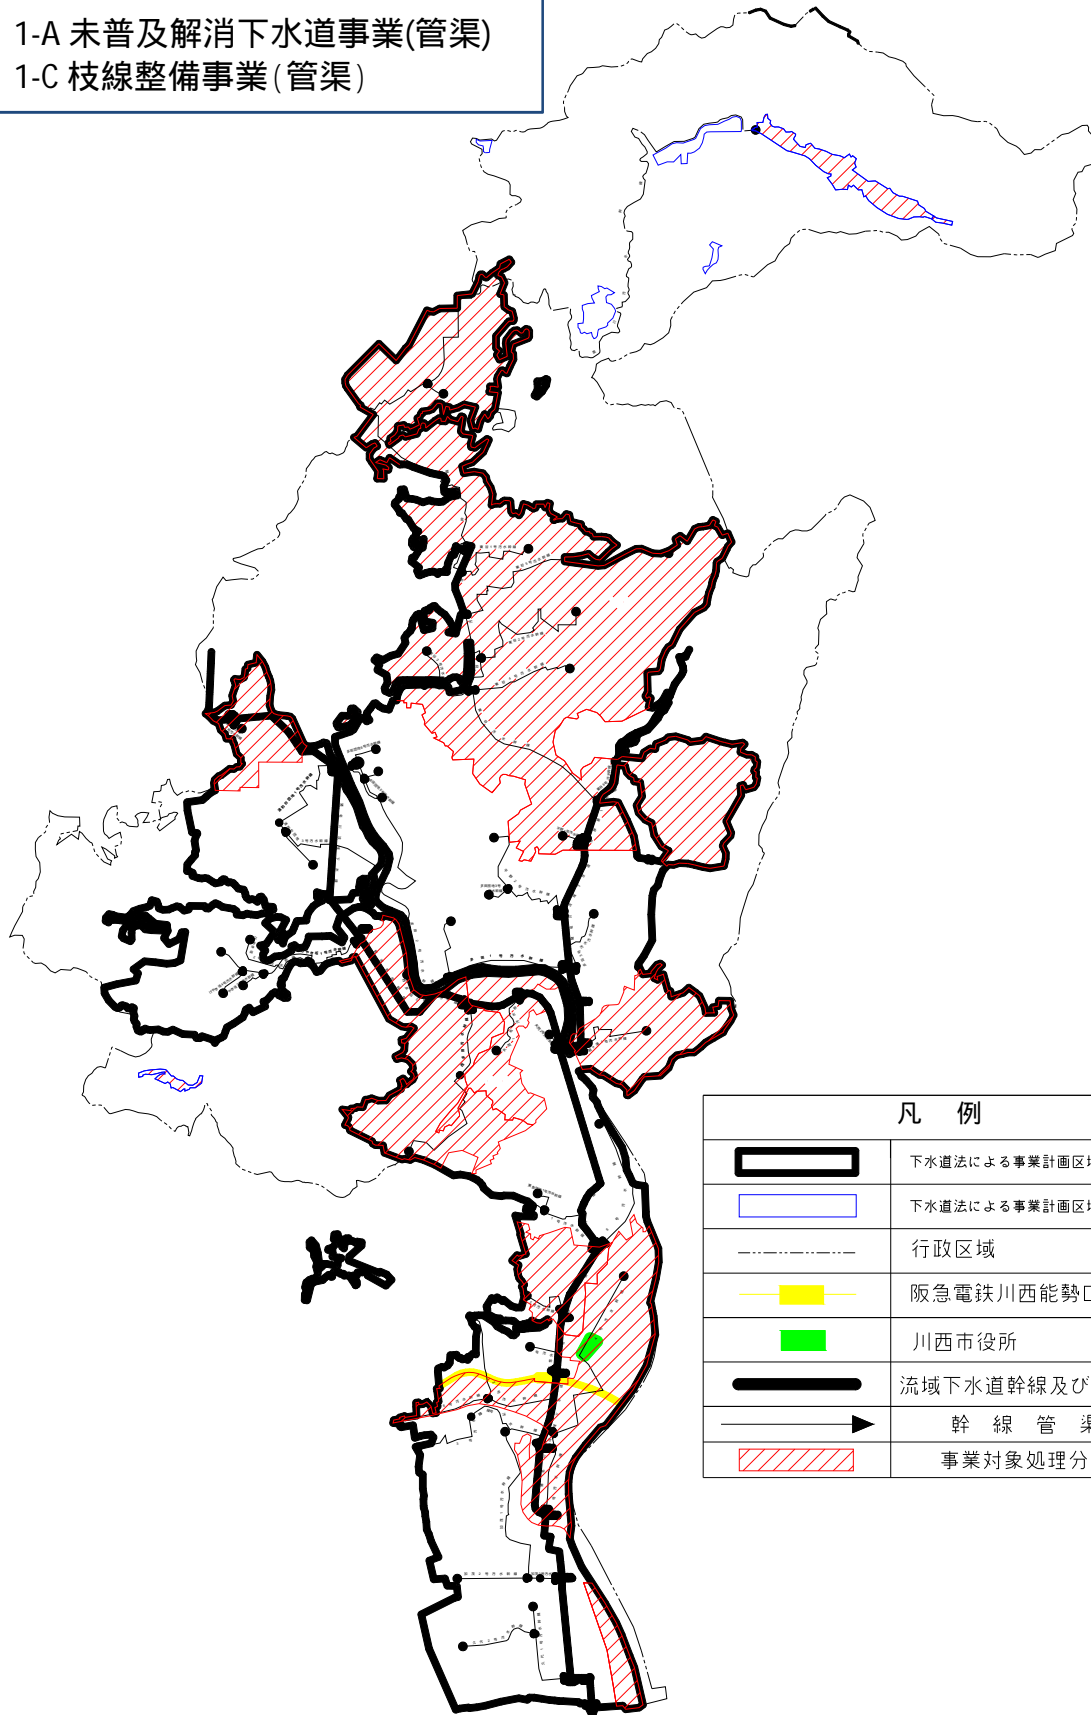計画の名称	1 川西市域における流域一体となった総合的な汚水・浸水対策の推進
計画の期間	平成23年度 ~ 平成27年度 (5年間)
交付対象	川西市

1-A 未普及解消下水道事業(管渠)
1-C 枝線整備事業(管渠)



凡 例	
	下水道法による事業計画区域(公共)
	下水道法による事業計画区域(特環)
	行政区域
	阪急電鉄川西能勢口駅
	川西市役所
	流域下水道幹線及び投入点
	幹線管渠
	事業対象処理分区
